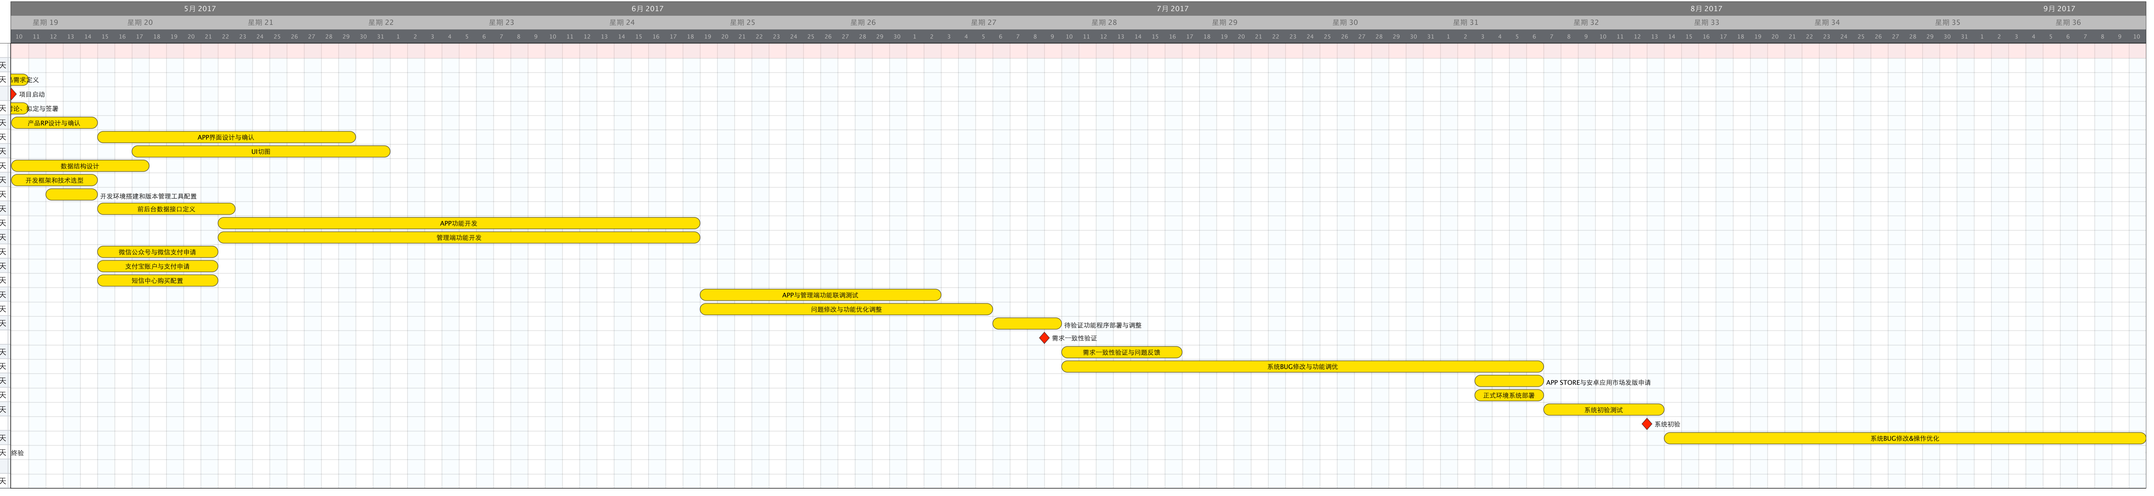	团队组建	2017- 5- 2 上午 8:00	2017- 5- 7 下午 8:00	6 天
	产品需求定义	2017- 5- 6 上午 8:00	2017- 5-10 下午 8:00	5 天
	项目启动	2017- 5-10 上午12:00		
	合作协议讨论、拟定与签署	2017- 5- 6 上午 8:00	2017- 5-10 下午 8:00	5 天
	产品RP设计与确认	2017- 5-10 上午 8:00	2017- 5-14 下午 8:00	5 天
	APP界面设计与确认	2017- 5-15 上午 8:00	2017- 5-29 下午 8:00	15 天
	UI切图	2017- 5-17 上午 8:00	2017- 5-31 下午 8:00	15 天
	数据结构设计	2017- 5-10 上午 8:00	2017- 5-17 下午 8:00	8 天
	开发框架和技术选型	2017- 5-10 上午 8:00	2017- 5-14 下午 8:00	5 天
	开发环境搭建和版本管理工具配置	2017- 5-12 上午 8:00	2017- 5-14 下午 8:00	3 天
	前后台数据接口定义	2017- 5-15 上午12:00	2017- 5-22 下午 8:00	8 天
	APP功能开发	2017- 5-22 上午 8:00	2017- 6-18 下午 8:00	28 天
	管理端功能开发	2017- 5-22 上午12:00	2017- 6-18 下午 8:00	28 天
	微信公众号与微信支付申请	2017- 5-15 上午 8:00	2017- 5-21 下午 8:00	7 天
	支付宝账户与支付申请	2017- 5-15 上午 8:00	2017- 5-21 下午 8:00	7 天
	短信中心购买配置	2017- 5-15 上午 8:00	2017- 5-21 下午 8:00	7 天
	APP与管理端功能联调测试	2017- 6-19 上午 8:00	2017- 7- 2 下午 8:00	14 天
	问题修改与功能优化调整	2017- 6-19 上午 8:00	2017- 7- 5 下午 8:00	17 天
	待验证功能程序部署与调整	2017- 7- 6 上午 8:00	2017- 7- 9 下午 8:00	4 天
	需求一致性验证	2017- 7- 9 上午12:00		
	需求一致性验证与问题反馈	2017- 7-10 上午 8:00	2017- 7-16 下午 8:00	7 天
	系统BUG修改与功能调优	2017- 7-10 上午 8:00	2017- 8- 6 下午 8:00	28 天
	APP STORE与安卓应用市场发版申请	2017- 8- 3 上午12:00	2017- 8- 6 下午 8:00	4 天
	正式环境系统部署	2017- 8- 3 上午 8:00	2017- 8- 6 下午 8:00	4 天
	系统初验测试	2017- 8- 7 上午 8:00	2017- 8-13 下午 8:00	7 天
	系统初验	2017- 8-13 上午12:00		
	系统BUG修改&操作优化	2017- 8-14 上午 8:00	2017- 9-10 下午 8:00	28 天
	系统终验	2017- 9-11 上午 8:00	2017- 9-17 下午 8:00	7 天
	系统终验	2017- 9-17 上午12:00		
	系统维保阶段	2017- 9-17 上午12:00	2018- 9-18 下午 8:00	365 天
